

GPMS • RODADA 2

CPD Monitor

Execução e configuração

V1 • Temperatura dinâmica

V2 • Alertas

Brenda • Filipe • Davis • Paulo • Roger

SENSOR / FIWARE

24,5 °C

ALERTAS

O que a Rodada 2 exigia?

01

Git + branches

Controle de versões

02

Issues + repositório

Controle de modificações

03

Burndown + EVM

Monitoramento acumulado

04

Escopo + Gantt + riscos

Atualização justificada

05

V2 funcionando

Demonstração parcial

Escopo: V1 finalizada + V2 entregue

V1 • CONCLUÍDA

Temperatura

FIWARE → backend → interface

V2 • CONCLUÍDA

Alertas

Regras → geração → interface

EVOLUÇÃO DO ESCOPO

- 65 pontos pendentes da V1 concluídos na R2
- V2 desenvolvida sem mudança de escopo ao final

Mudança relevante no cronograma: conclusão geral em 06/10, contra 05/10 planejado.

EAP + Planning Poker

V1 PENDENTE

65 pts

3.2 a 3.6

ATIVIDADES NOVAS

43 pts

Grupos 4 e 6

GESTÃO RECORRENTE

10 pts

1.1, 1.5 e 1.6

TOTAL ACOMPANHADO

118 PONTOS

Critério adotado na equipe: 1 ponto = 1 hora estimada.

Estratégia de branches (GitFlow)

Integração de funcionalidades

Pull Requests #22 e #23

main

develop


feature/...

feature/v2-alertas

feature/sensor-ar-condicionado

Branches reais registradas no plano: main, develop e branches específicas de funcionalidades.

GitHub: issues, commits e PRs

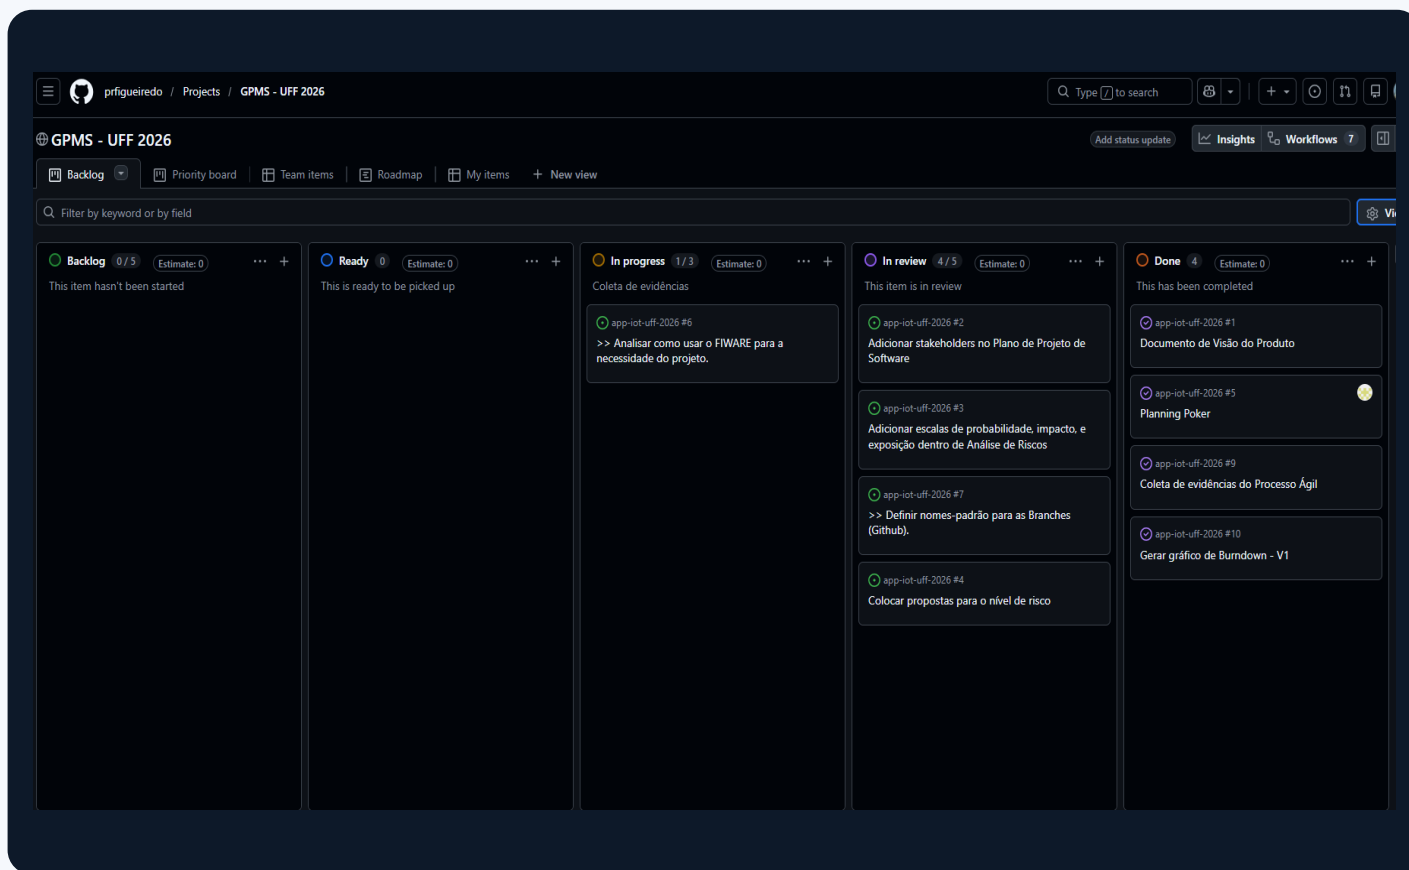


REGISTROS UTILIZADOS

- Issues: bug
- Issues: enhancement
- Issues: question
- Commits + PRs

Quadro de tarefas e histórico no repositório

Repositório e rastreabilidade

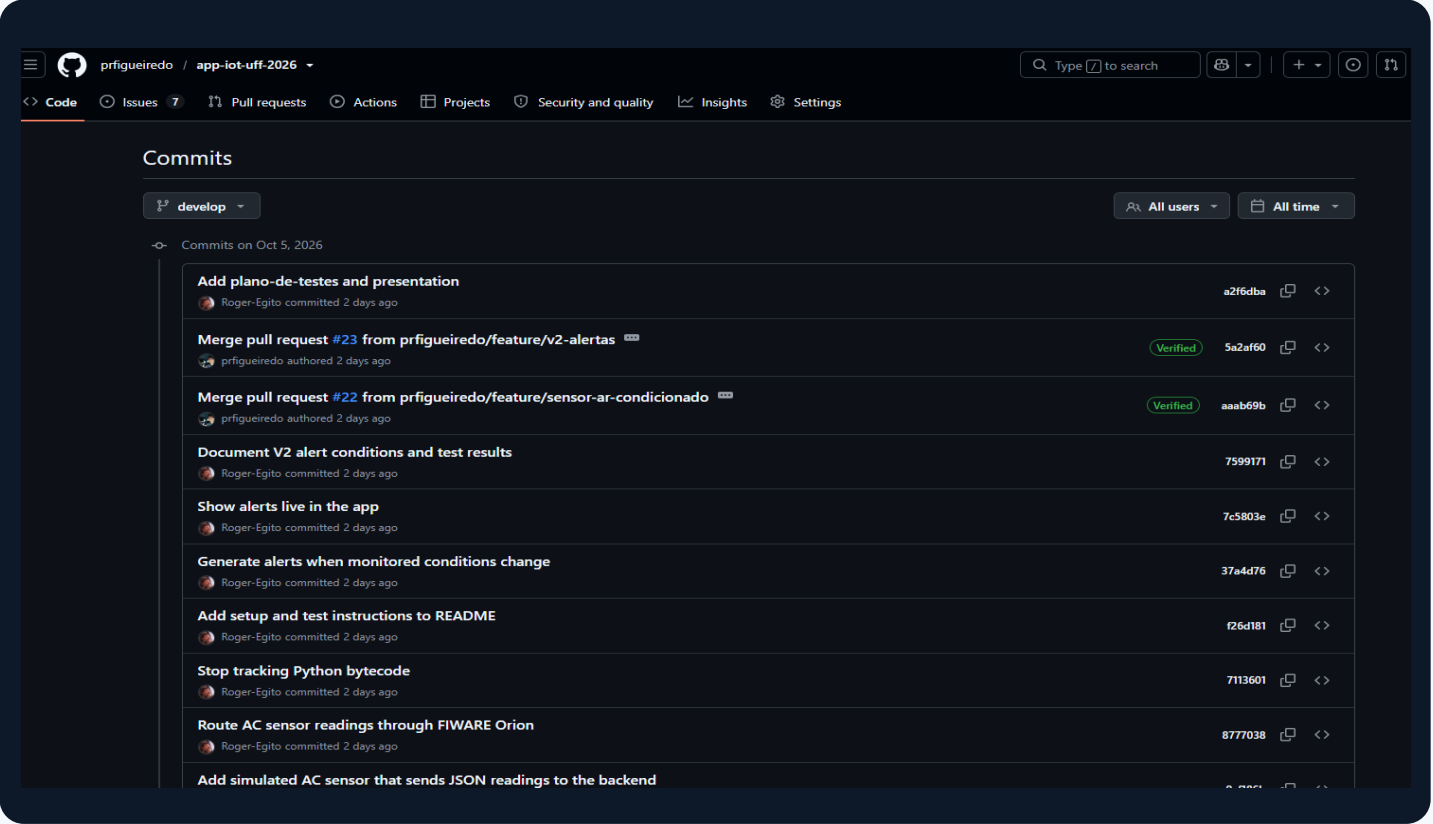

CÓDIGO + HISTÓRICO

GitHub público

KANBAN

GitHub Projects

LINKS CLICÁVEIS NO FINAL

O relatório registra os endereços do repositório e do quadro de atividades.

Gantt: desenvolvimento da V1 e V2



Gantt: gestão, configuração e entrega



Nota: 6.5 e 6.6 mostram apenas a data de conclusão; não há início confirmado nos dados.

Linha vermelha: prazo previsto (05/10)

Riscos: acompanhamento e resposta

R03	Disponibilidade da equipe	P × I 5 × 3	ALTA 15
R04	Esforço maior que o previsto	P × I 4 × 3	MÉDIA 12
R01	Configuração do FIWARE	P × I 4 × 4	ALTA 16

Resposta: atualizar Gantt + monitorar riscos + registrar desvio de 1 dia

R03 e R04 foram relacionados ao atraso, sem necessidade de alterar o escopo da V2.

Custos e orçamento

GRUPOS 4.x + 6.x

43 h

Atividades novas e apoio

CUSTO ESTIMADO

R\$ 1.663,67

43 × R\$ 38,69

COM RESERVA 10%


R\$ 1.830,04

Reserva: R\$ 166,37


Fora desta base: 65 pts pendentes da V1 + 10 pts de gestão recorrente

Orçamento do subconjunto 4.x e 6.x; EVM usa a linha de base acumulada do projeto.

Participação da equipe

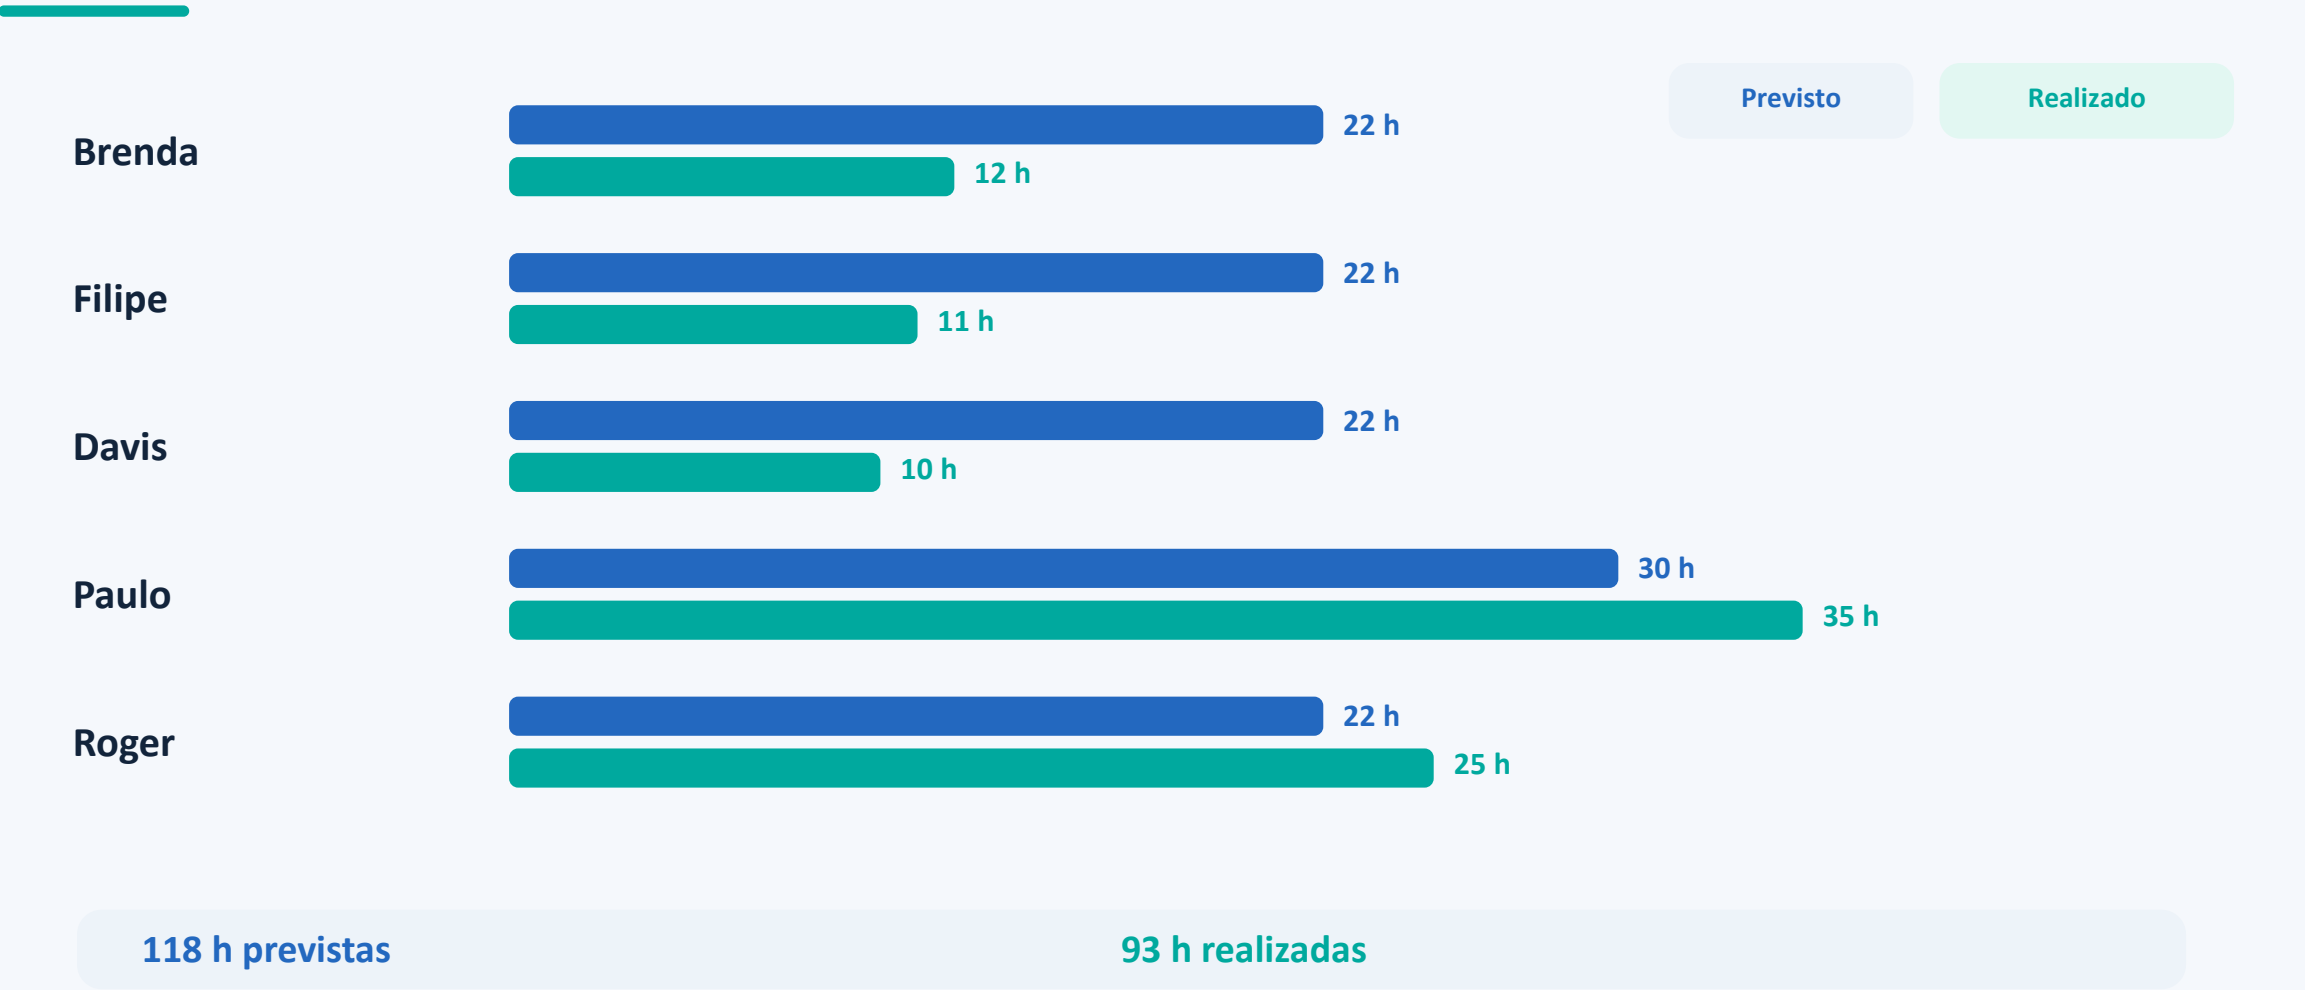


Burndown: 118 → 0 pontos

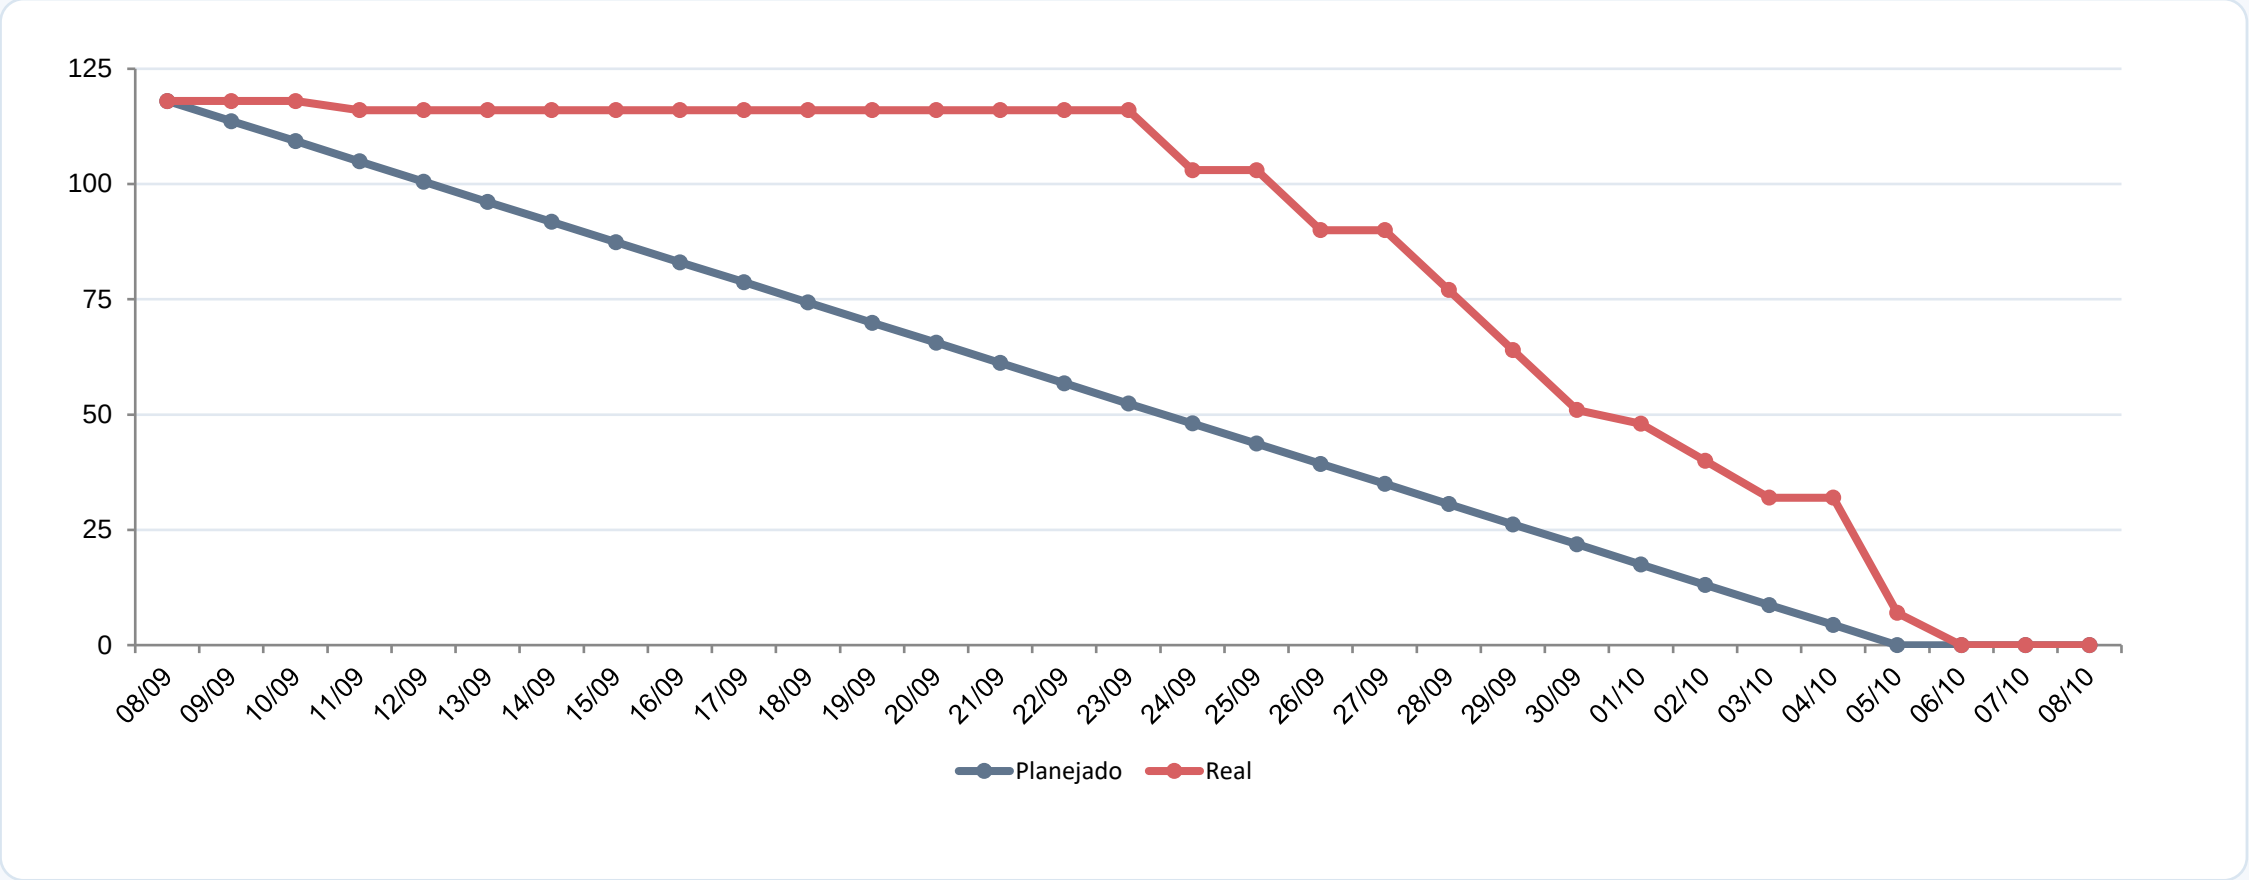

05/10: 7 pontos pendentes | 06/10: escopo concluído | atraso de 1 dia.

EVM: resultado acumulado

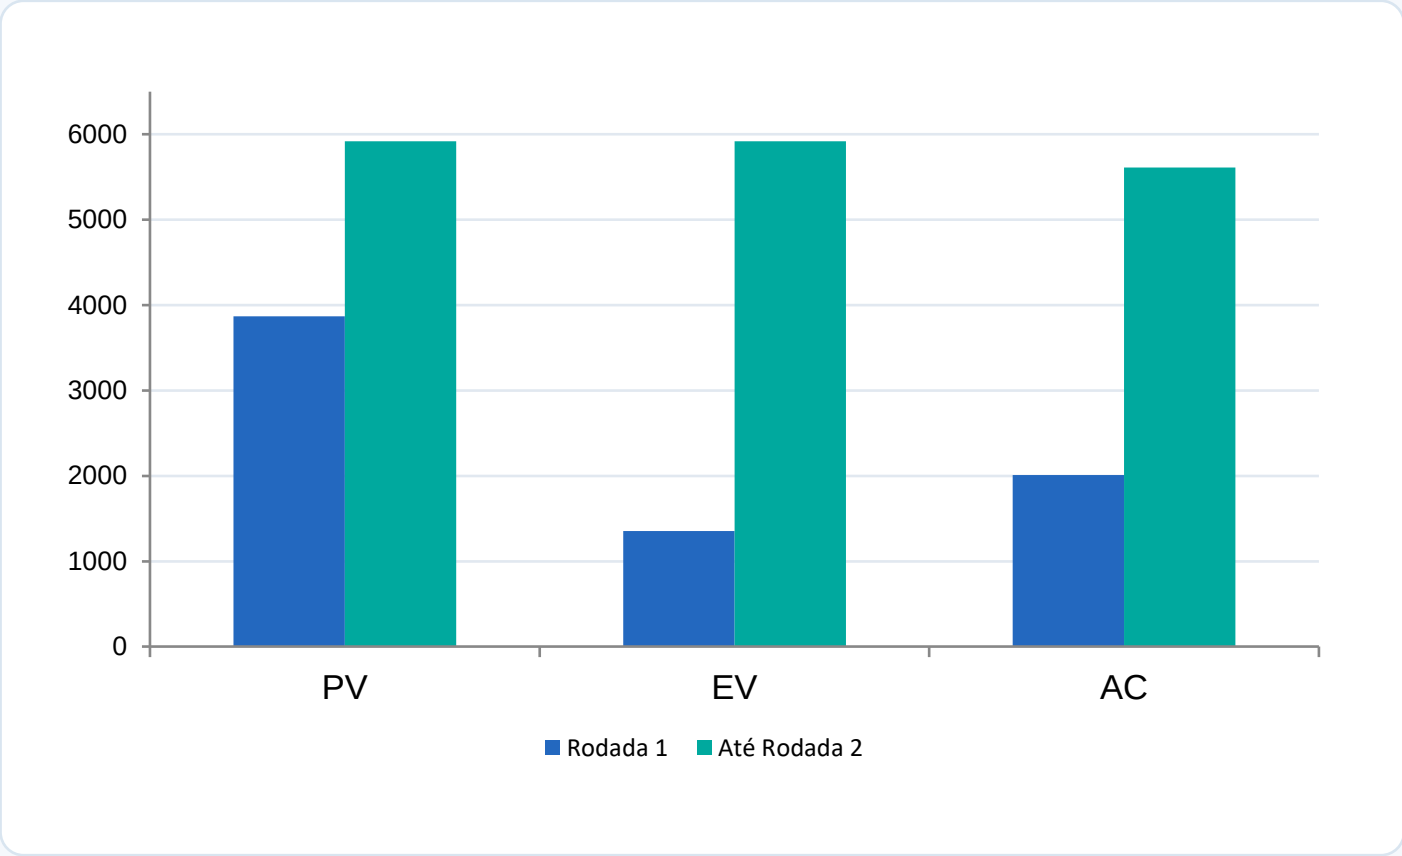

SPI ACUMULADO

1,00

Escopo estimado concluído


CPI ACUMULADO

1,06

Custo abaixo do previsto

R2 acumulada: PV = EV = R\$ 5.919,57 | AC = R\$ 5.610,05 | atraso de 1 dia no calendário.

V1: temperatura em tempo real

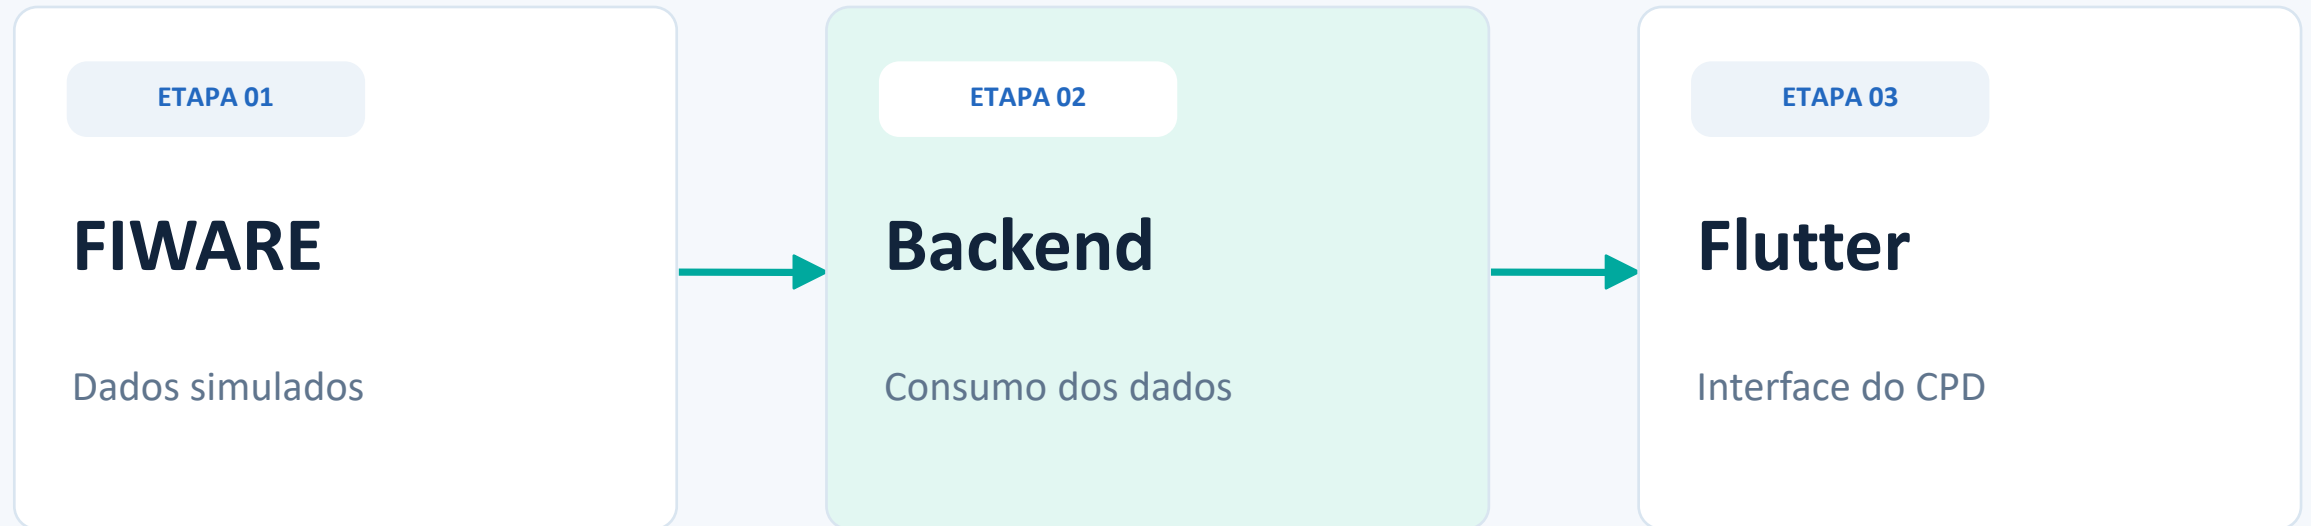

Resultado: atualização dinâmica de temperatura na interface

Representação do fluxo técnico; utilizar demonstração real do aplicativo durante a apresentação.

V2: alertas integrados à interface

FLUXO DO ALERTA

- 1 Temperatura recebida
- 2 Condição avaliada
- 3 Alerta gerado
- 4 **Exibição na interface**

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

Inserir captura real da V2

ou abrir o aplicativo durante a apresentação

Não foi fornecida captura da tela de alertas. Área pronta para substituição por evidência real.

Resultados e próxima etapa

ENTREGA

V1 + V2

Temperatura e alertas

CRONOGRAMA

+1 dia

Conclusão em 06/10

PRÓXIMA RODADA

V3

Histórico de dados

Controle: GitHub + Gantt + Burndown + EVM

Rodada 3: histórico de temperaturas e alertas, integração e validação.

CPD Monitor

Rodada 2 concluída

[GitHub: prfigueiredo/app-iot-uff-2026](#)

[Projects: github.com/users/prfigueiredo/projects/2](https://github.com/users/prfigueiredo/projects/2)

[CÓDIGO](#) • [ISSUES](#) • [HISTÓRICO](#)

Obrigado!
